PLANNING DE PERIODE DE PREPARATION DE CHANTIER 1 MOIS

N°	LOT	Nom de la tâche	Semaine 1							Semaine 2							Semaine 3							Semaine 4						
			D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
1	TCE	Ordre de service	1	1																										
2	DEMOLITION	Fourniture plan de retrait amiante	2																											
3	VRD GROS ŒUVRE	DICT	3																											
4	**Plans de réservation TCE et plans d'exécution**		4																											
5	PLOMBIER	Transmission attentes EU EP AEP GAZ TELECOM FIBRE EDF en dallage	5																											
6	GROS ŒUVRE	Transmission plans de réseau sous dallage	6							6																				
7	MENUISIER	Transmission détails de seuils, appuis, linteaux, menuiseries extérieures	7																											
8	VRD	Transmission plan de réseaux extérieurs	8														8													
9	CHARPENTIER	Transmission descentes de charges de charpente	9																											
10	CHARPENTIER	Transmission plan de charpente	10							10																				
11	PLOMBIER CHAUFFAGISTE	Transmission plans réservation VMC - CHAUFFAGE - PLOMBERIE	11																											
12	PLOMBIER CHAUFFAGISTE	Transmission plans exécution VMC - CHAUFFAGE - PLOMBERIE	12							12																				
13	ELECTRICIEN	Transmission réservations électricité	13																											
14	ELECTRICIEN	Transmission plan exécution électricité	14							14																				
15	COUVREUR	Transmission réservation couverture étanchéité EP	15														15													
16	CLOISONS ISOLATION	Transmission des épaisseurs de doublages + réservations éventuelles	16																											
17	REVETEMENTS DE SOLS	Transmission réservation de sol (chapes, paillassons…)	17																											
18	ASCENSEUR	Transmission plans réservation ascenseur	18																											
19	ASCENSEUR	Transmission plans exécution ascenseur	19																											
20	MENUISERIES BOIS	Transmission réservations menuiseries bois (escaliers blocs-portes, portail garage)	20																											
21	SERRURIER	Transmission réservations serrurerie	21																											
22	SERRURIER	Transmission plan exécution serrurerie	22																											
23	PLAFONDS	Transmission réservation faux-plafonds	23																											
24	PLAFONDS	Transmission plans de calpinage faux-plafonds	24														24													
25	VRD ESPACES VERTS	Transmission plans aménagements extérieurs	25																					25						
26	ELECTRICIEN PLOMBIER CHAUFFAGISTE	Transmission cahiers de matériels	26														26													
27	PEINTRE REVETEMENTS DE SOLS	Transmission échantillons	27																					27						
28	GROS ŒUVRE	Plans béton (au moins fondation, dallage 1er niveau)	28							28																				
29	GROS ŒUVRE VRD	Constat d'huissier	29																					29						
30	GROS ŒUVRE	Transmission plans d'installation de chantier pour validation	30																											
31	GROS ŒUVRE	Mise en place de l'installation de chantier	31																					31						
32	TCE	Visite d'inspection commune fourniture PPSPS 1 mois avant intervention	32																										32	
33	GROS ŒUVRE	Transmission du projet de panneau de chantier pour validation M.O.	33																											
34	GROS ŒUVRE	Pose du panneau dechantier	34																					34						
35	GROS ŒUVRE	Vérification du bornage	35																											
36	GROS ŒUVRE	Implantation	36																					36						
37	GROS ŒUVRE	Demande raccordement eau - elect - tél pour chantier	37																											
38	VRD	Relevés des fils d'eau des exutoires EU EP	38																											
39		Fourniture à l'OPC délais par tâches pour planning détaillé	39																											
40		Signature par l'attributaire du lot du calendrier d'exécution détaillé des travaux	40																						40					

Côtes d'Armor Habitat
Construction de 3 pavillons RT2012
Park an Traou à LANRODEC (22)

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Hors congés et intempéries

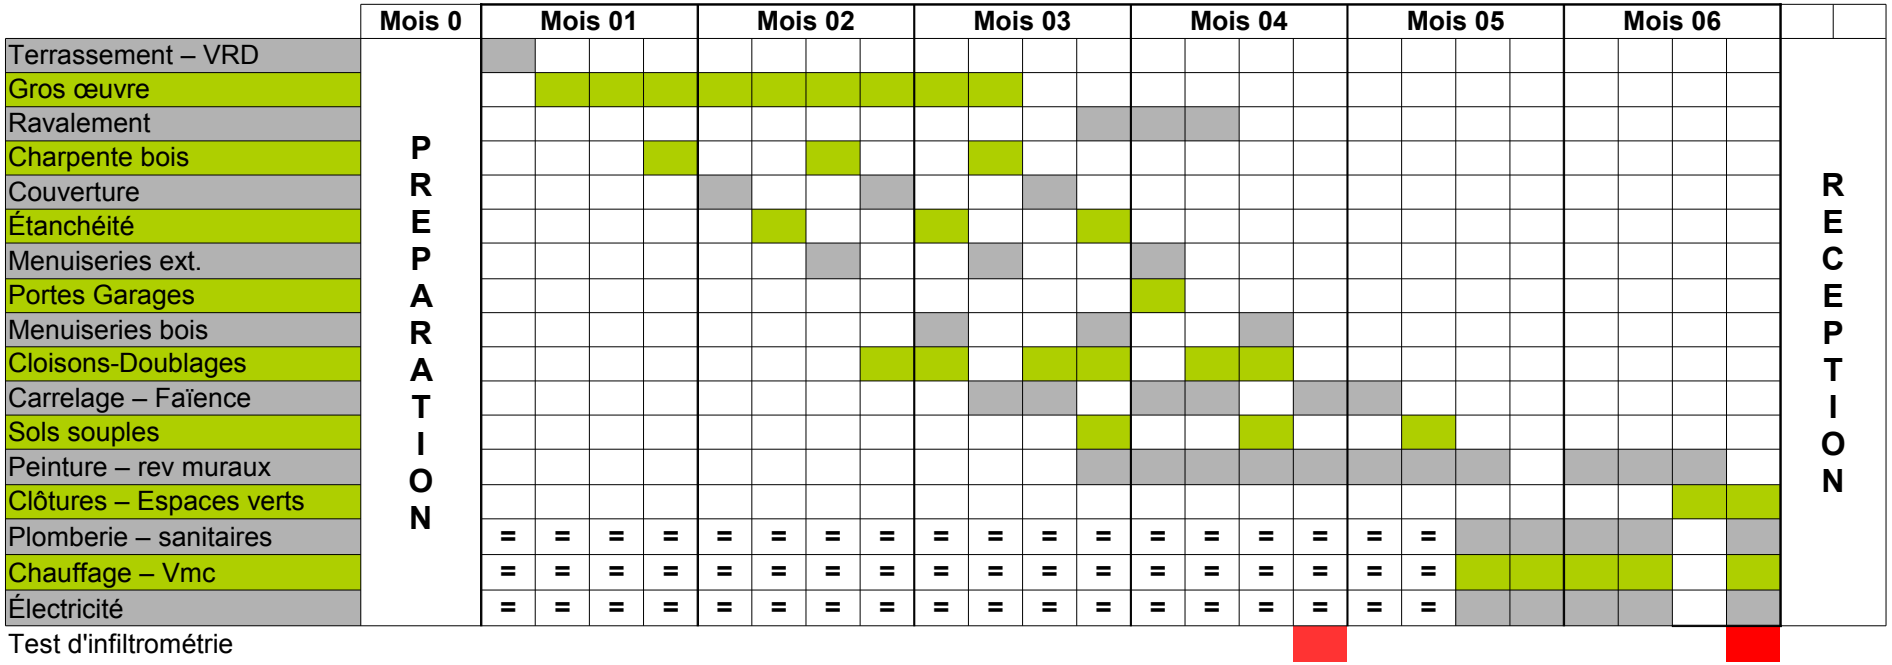

20/12/2013

20/12/2013
